



Gödöllő (bez) - Hatvan (kiz) vasútvonal átépítése

Előadó:

Kónya Viktor

Swietelsky Vasúttechnika Kft.

Átépités szakaszolása zavartatások szerint


- Vonatforgalom melletti átépités Aszód (bez.) – Hatvan elág. között
- Teljes kizárásos átépités Gödöllő (bez.) – Aszód (bez.) között

Vonatforgalom melletti átépítés Aszód(bez.) – Hatvan elág. között

16. fázis - 97 nap
2019.09.02. 1:45 - 2019.12.07. 23:59

A fázisban végzendő főbb munkák:

- * Aszód C peron kezdőponti része épül, fázis végére forgalomba helyezés
- * Aszód II., III., IV. vágányok kezdőponti része, V. vágány épül
- * Átépített Aszód a fázis végére teljesen üzembe helyezendő
- * Aszód V. vágány siklászító sarui a fázis végén leszerelendők
- * Aszód peronaluljáró a fázis végére elkészül
- * 2019.09.02. 1:45 – 2019.09.30. 2:55 között Aszód (kiz.) – Tura (bez.) jobb vágányán vágányzár lesz (591) szelvényig
- * Ivkorrekció földmunka konszolidáció (Tura)

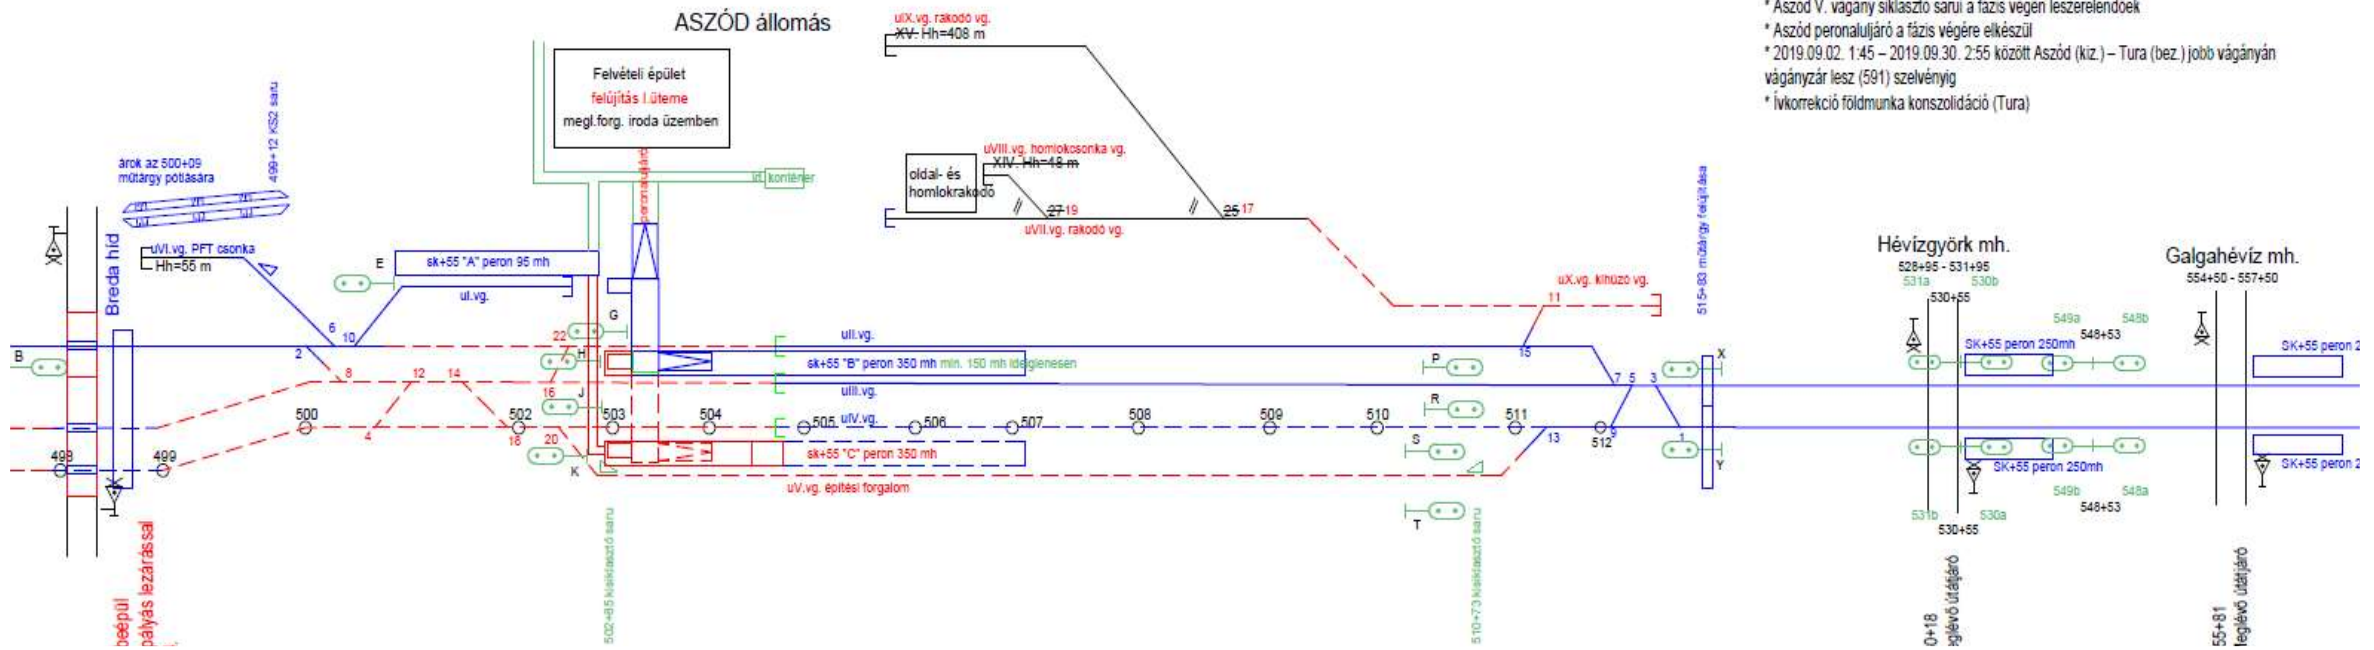

Műszaki kockázatok vonatforgalom melletti átépítésnél

- Nagytengelyben az alépítmény tervezett átépítése
- Alépítményi tervezés, stabilizációs technológia előnye
- Nyáron a kivetődés kockázata miatti lassújelek bevezetése
- Ideiglenes vízelvezetés megoldása pl.: megállóhelyeknél

Teljes kizárásos átépítés Gödöllő (bez.) – Aszód (bez.) között

- Köztársaság úti felüljáró építése miatti ideiglenes munkák 2018 nyarán
- Vonatpótlás feltételeinek biztosítása, pl.: utasforgalmi helyiségek elköltöztetése Gödöllőn
- Kritikus építmények: Köztársaság úti felüljáró és Galga híd
- Kapacitáskorlátozások 2020-ban: perontetők burkolására és Gödöllőn bevágási rézsű állékonyságának biztosításának munkáira

Összegzés

- Megfelelő zavartatás kiválasztásához térben és időben is kell elemezni
- Sikeres kapacitáskorlátozáshoz szükséges
 - Az előkészületekhez (tervezés, engedélyezés és szerződéskötések) szükséges idő biztosítása
 - Építési anyagok rendelkezésre állása (előre gyártott betonelemek, szóródó anyagok, kitérők)
 - Kizárás megfelelő hosszának meghatározása

A photograph of a construction site with a yellow excavator in the background. In the foreground, a yellow plastic bucket with the 'Potunia' logo is hanging from the excavator's arm. The bucket contains a vibrant pink petunia plant with several large, open flowers. The background is slightly blurred, showing the excavator's tracks and a worker in an orange safety vest in the distance.

Köszönöm figyelmüket!
